





Actions dans le bras principal Contrat 2015-2020 pour la Loire et ses Annexes de Nantes à Montsoreau

COPIL du 20 mai 2016, ANCENIS

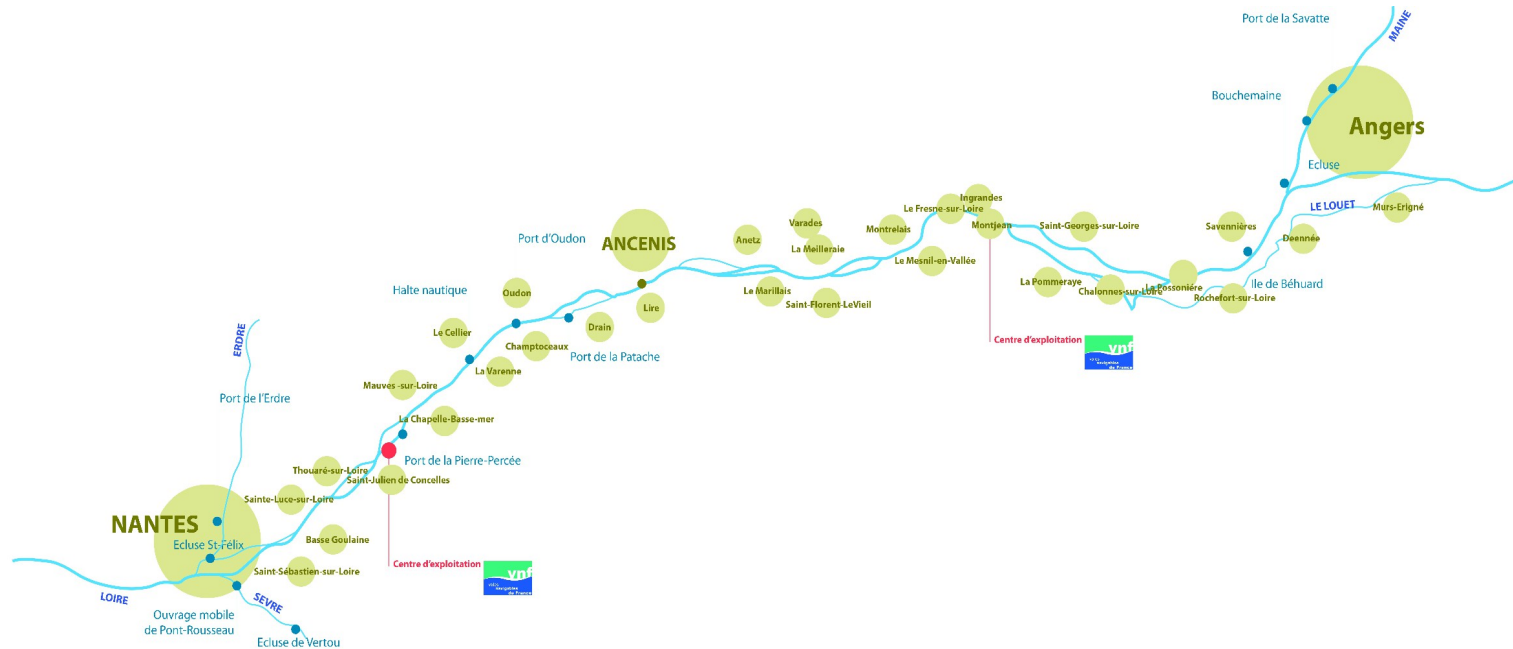

Cette opération est cofinancée par l'Union européenne.
L'Europe s'engage dans le bassin de la Loire avec le Fonds européen de développement régional.

1^{ère} phase 2015-2023 : 3 secteurs d'interventions

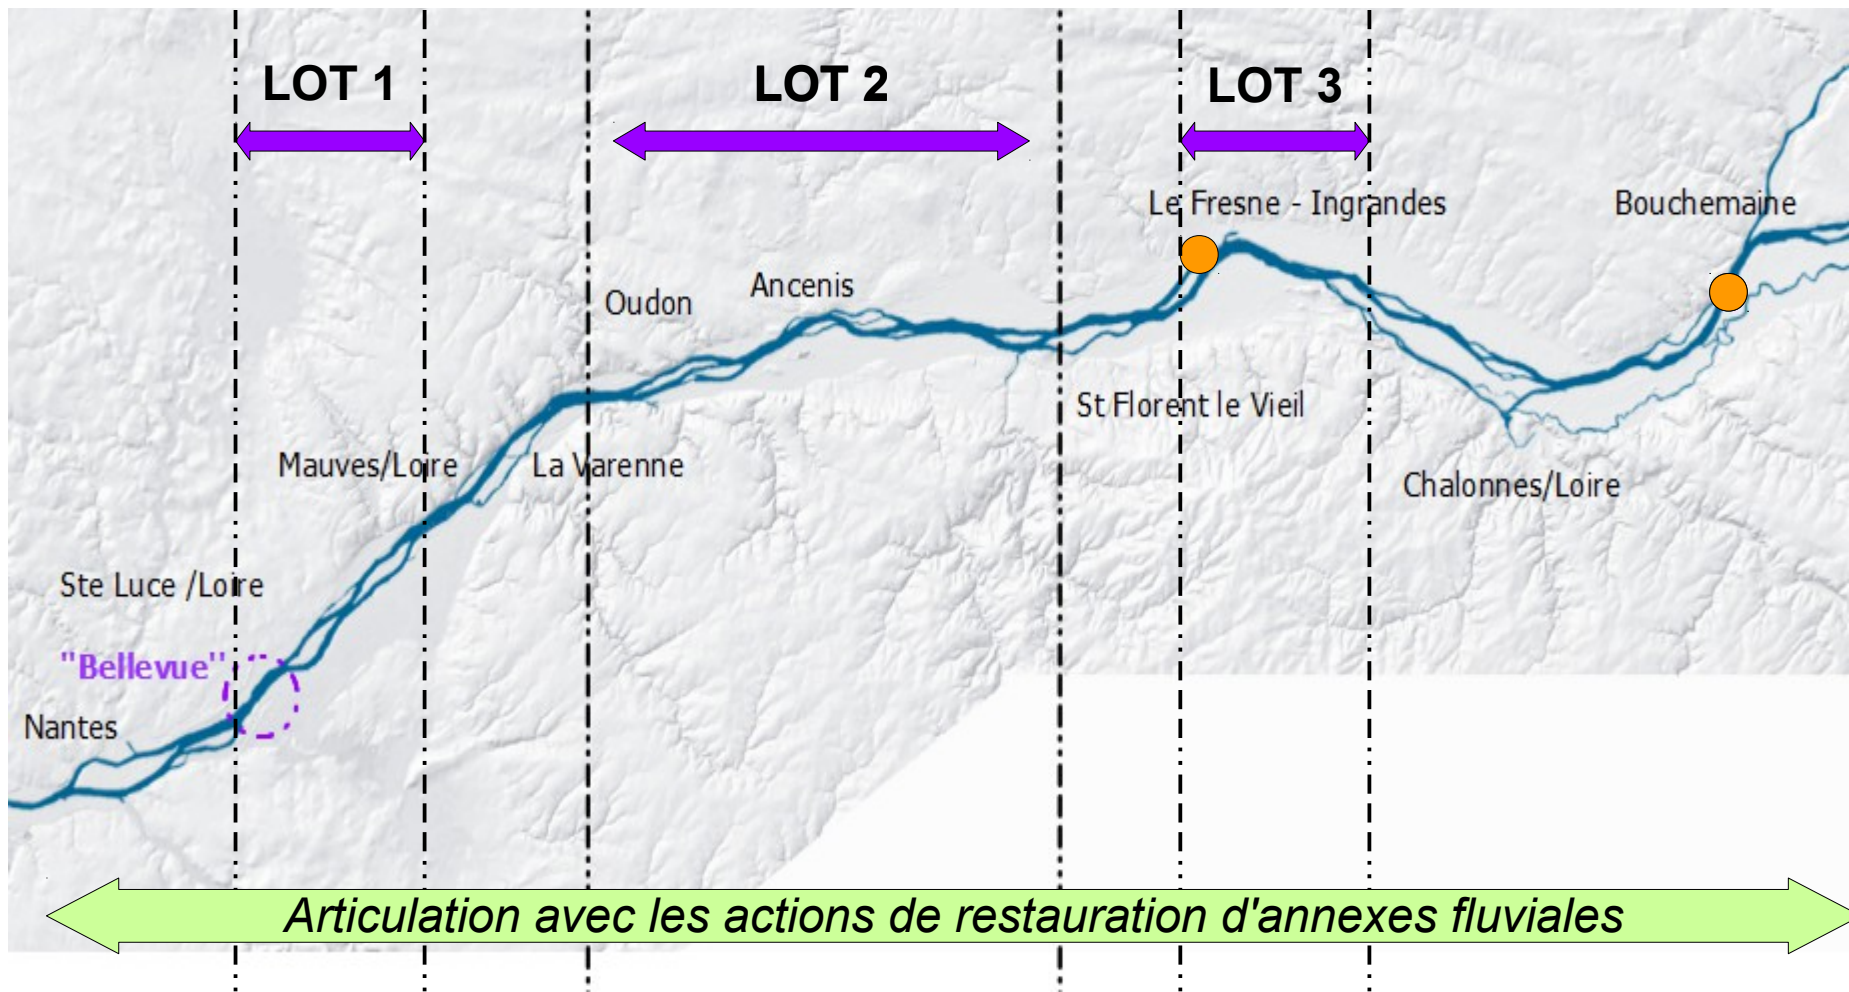

● Opérations expérimentales Plan Loire II et III

Attendus de ces interventions

Des actions menées pour le rééquilibrage du lit sur :

- 10 km en amont de Bellevue puis au delà en lien avec le rechargement des fonds
- 20 km entre Oudon et Saint Florent et la réalimentation d'un bras secondaire de 5 Km (bras de l'île Neuve Macriere)



Amont du bras de Neuve Macrière
commune d'Ancenis

- 7 km en amont des seuils du Fresne entre le Fresne-Ingrandes et Montjean sur Loire

Soit un cumul de 37 km sur les 80 km de Loire aménagée entre Angers et Nantes avec des effets au delà du lit mineur en faveur des annexes (bras secondaires, boires, zones humides adjacentes)

Les engagements financiers associés

- Une première phase évaluée à 42M€ ttc (valeur 2015) sur un programme global de 62M€ :
 - 34,6 M€ de travaux entre 2018 et 2023
 - 7,4 M€ d'études et de suivis entre 2015 et 2023
- Programmé dans le cadre du Contrat Loire et Annexes sur la période 2015-2017 : 5 563 000€

Les étapes réalisées

2011-2013 : étude sous maîtrise d'ouvrage du GIP pour définir une stratégie d'action entre Nantes et les Ponts de Cé,

2014 : Engagement de VNF dans la maîtrise d'ouvrage et dans la conduite de 4 opérations sur la période 2014-2020

2015 : construction et signature du Contrat pour la Loire et ses Annexes de Nantes à Montsoreau

À partir d'avril 2015 : lancement des études pré-opérationnelles

- Une démarche de concertation pour aboutir à l'élaboration d'un programme de travaux
- La validation du programme de travaux par les instances du CLA
- L'approbation du programme de travaux par la Direction Générale de VNF (février 2016)



Ateliers de concertation mai et juin 2015

Les missions en cours et à venir

Études réglementaires

Désignation du prestataire en charge de réaliser les inventaires naturalistes (terrestres et aquatique), l'étude d'impact du projet, l'évaluation des incidences N2000 puis les dossiers d'autorisation pour chaque secteur (procédure IOTA unique)

début juin 2016

durée de la mission 48
mois

Études de conception (mission de MOE et modélisations hydrauliques)

Désignation des prestataires des 3 lots de maîtrise d'œuvre en cours

début juillet 2016

Étude géologique

mission en cours

mai 2016

Mesures de vitesses et de débits

Consultation en cours. Mesures en continue sur 3 sites, mesures ponctuelles...

début août 2016

durée de la mission 12
mois minimum
